


Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører

Fredrik Bakkemo Kostøl og Jonas Måøy
Fafo Østforum seminar 8. oktober 2019




Offentlige investeringer i bygg og anlegg

Kilde: Nasjonalregnskapet og Statistisk sentralbyrå

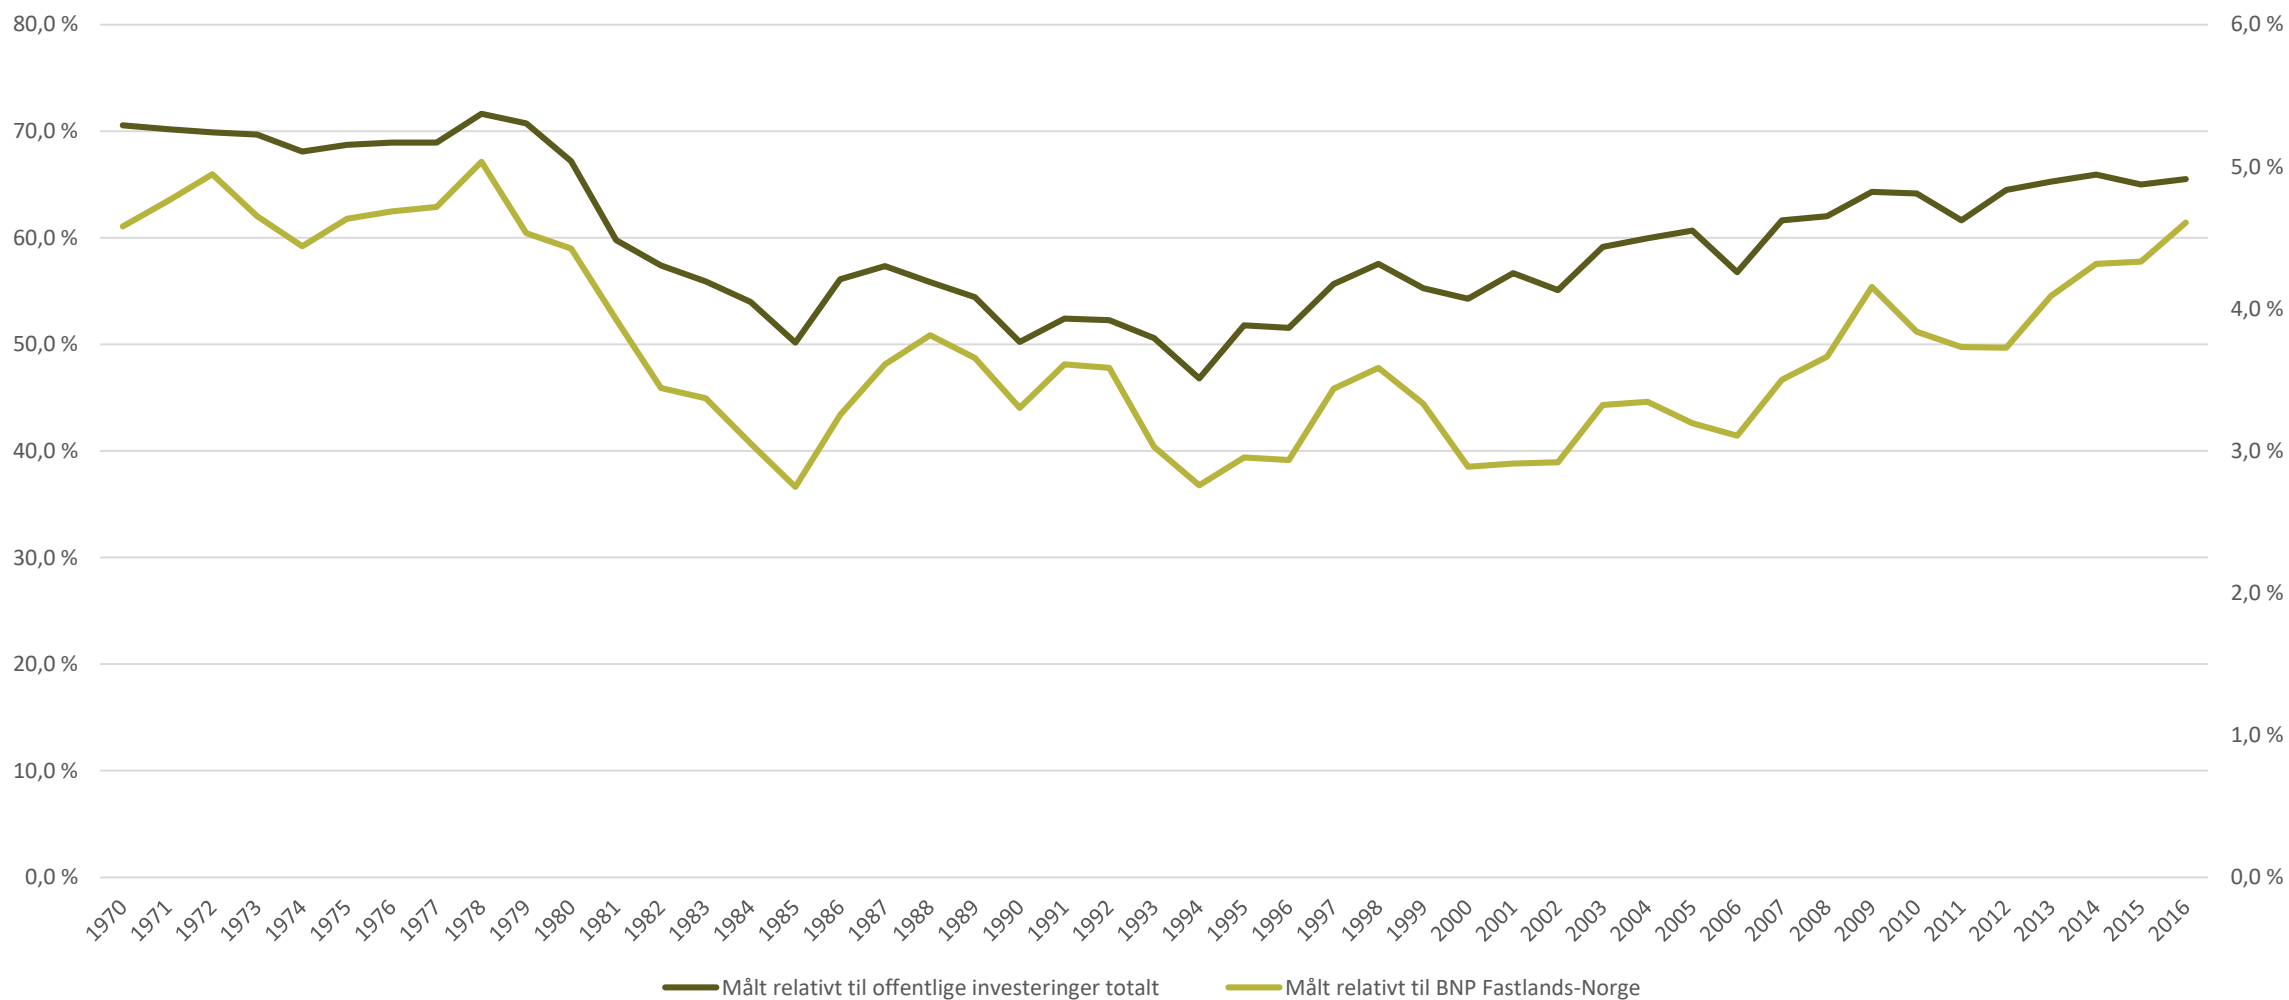

Infrastrukturinvesteringer relativt til BNP

Kilde: OECD

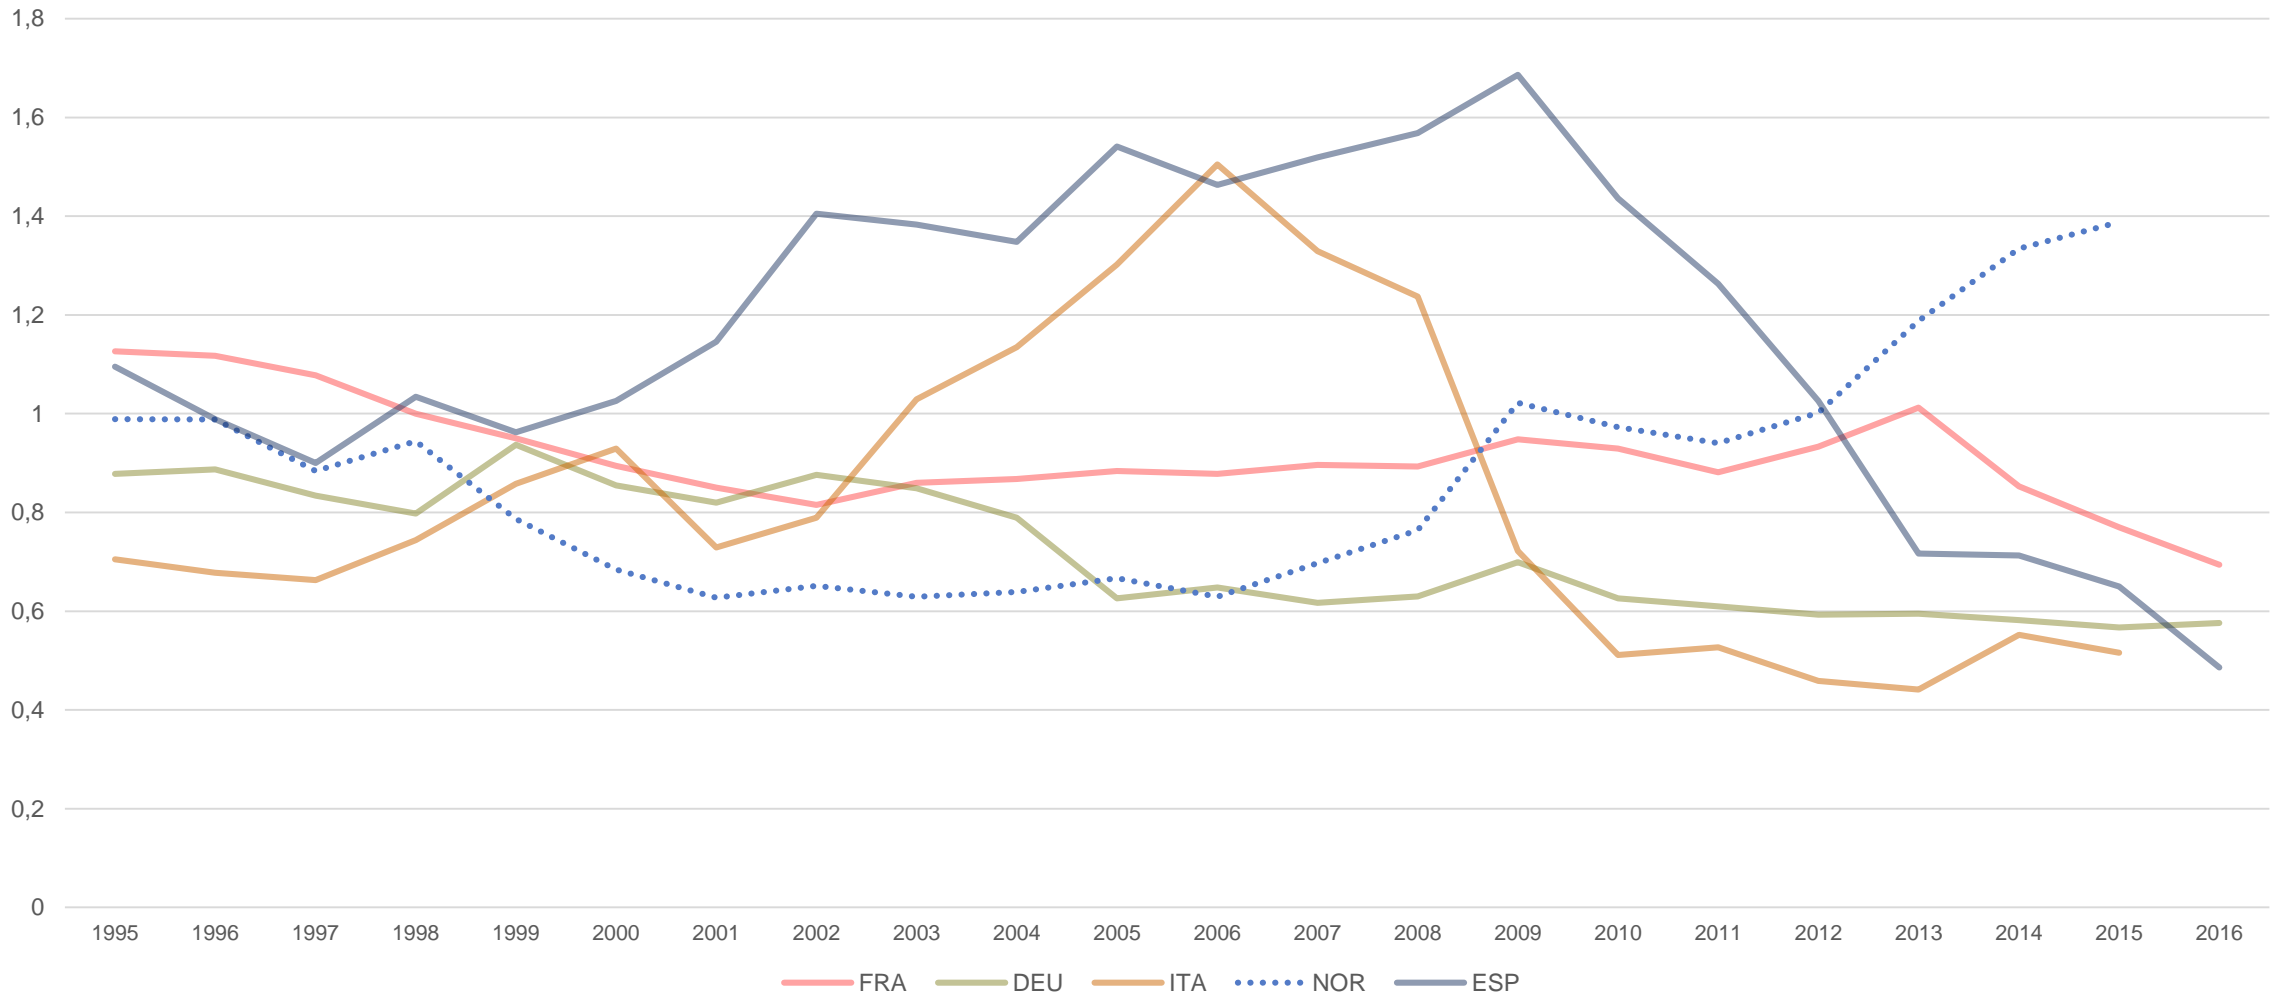


Follobanen

- **2009:** DNV utredet alternativer for utbygging. Best ut kom et alternativ på 15 mrd. 2018-kroner
- **2011:** Asplan Viak utfører KVU
- **2014:** KS2 anslår kostnadene til å bli på 23,6 mrd. 2018-kroner.
 - Styringsramme: 27,2 mrd.
 - Kostnadsramme: 29,4 mrd.

Entreprise	Entreprenør	Kontrakt	Planlagt oppstart	Planlagt ferdigstillelse
EPC D&B	Condotte *	1,2 mrd. 2015-kroner	Jan 2016	Høst 2019
EPC TBM	AGJV **	8,7 mrd. 2015-kroner	Sep 2016	Mar 2019
EPC Civil Oslo S	Condotte og Baneservice	2,2 mrd. 2015-kroner	Jan 2016	Høst 2019
EPC JBT	Infranord Norge	475 mill. 2017-kroner	Mai 2017	2022
EPC Ski	OHL ***	2,3 mrd. 2015-kroner	Aug 2015	2022

Follobanen

- **2016:** Søksmål fra Skanska – 350 millioner 2018-kroner i erstatning
- **2017:** Likvididetsproblemer i Condotte
- **2018:** Condotte konkurs
- **2019:** Prognostisert sluttkostnad 29,5 mrd. 2018-kroner

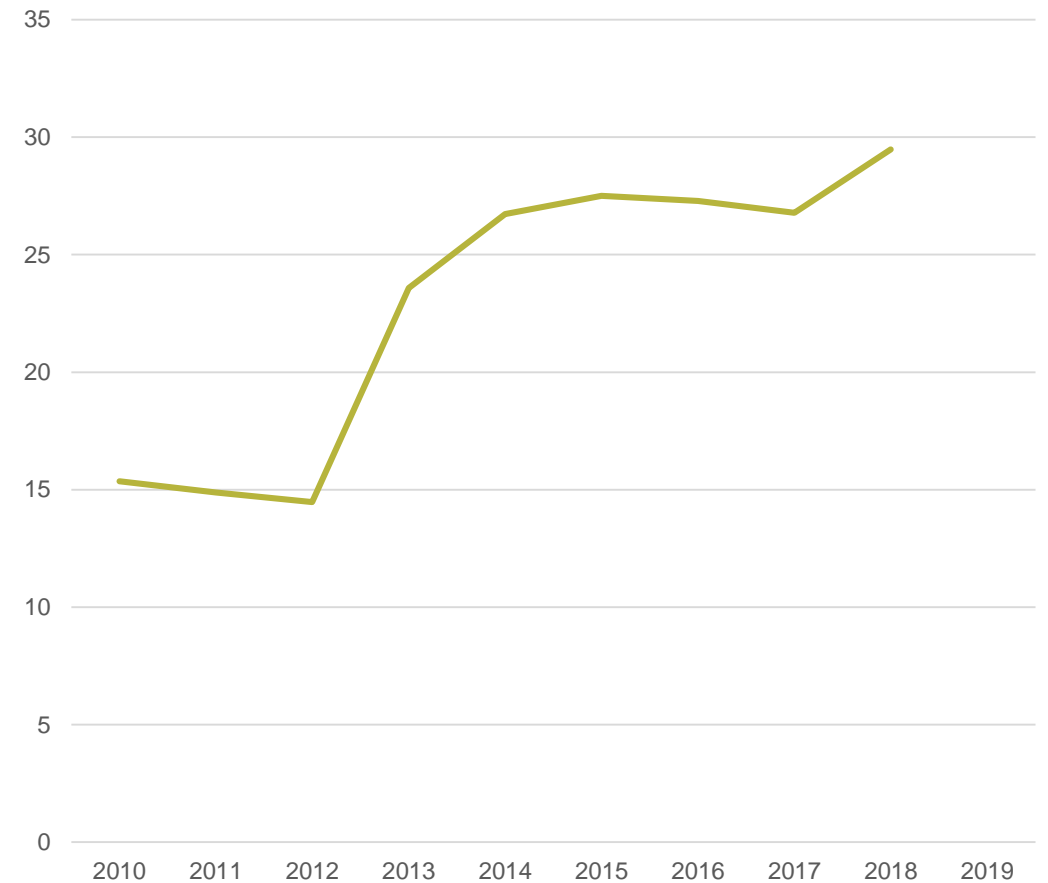

Andre prosjekter

- Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen: Alpine Bau går konkurs – foreløpig 900 millioner over KS2
- E6 Hålogalandsbrua: E. Phil og Søn går konkurs, store forsinkelser og etterarbeid for SBRG – 600 millioner over KS2

Sammendrag

Prosjekt	Entreprenør	Kostnadssprekk *	Forsinkelse	Rettslig tvist	Status
Follobanen	Condotte	Ja	Ja	Nei	Konkurs
Follobanen	AGJV	Ja	Nei	Uenighet om sluttoppgjør, men foreløpig ikke rettslig tvist	OK
Follobanen	OHL	Ja	Ja	Uenighet om sluttoppgjør, men foreløpig ikke rettslig tvist	OK
Fellesprosjektet E6	Alpine Bau	Ja	Ja	Nei	Konkurs
Grimstad-Kristiansand	Bilfinger	Nei	Nei	Tvist med underentreprenør	OK
Grimstad-Kristiansand	Pihl	Nei	Nei	Nei	OK
Grimstad-Kristiansand	Meister	Nei	Nei	Tvist med hovedentreprenør	Konkurs
Hålogalandsbrua	Pihl	Ja	Ja	Nei	Konkurs
Hålogalandsbrua	SRBG	Ja	Ja	Nei	OK
Alta Vest	Pihl	Ja	Ja	Nei	Konkurs
Alta Vest	Istak	Ja	Ja	Nei	OK
Alta Vest	Alpine Bau	Ja	Ja	Nei	Konkurs
Sørkjostunnelen	OSSA	Ja	Ja	Tvist med byggherre	Kontrakt hevet
UBRA	OSSA	Nei	Ja	Nei	Kontrakt avsluttet
Tresfjordbrua	Bilfinger/PORR	Ja	Ja	Nei	OK
